




Seguiment execució Projectes 2016-17



Evolució de les propostes

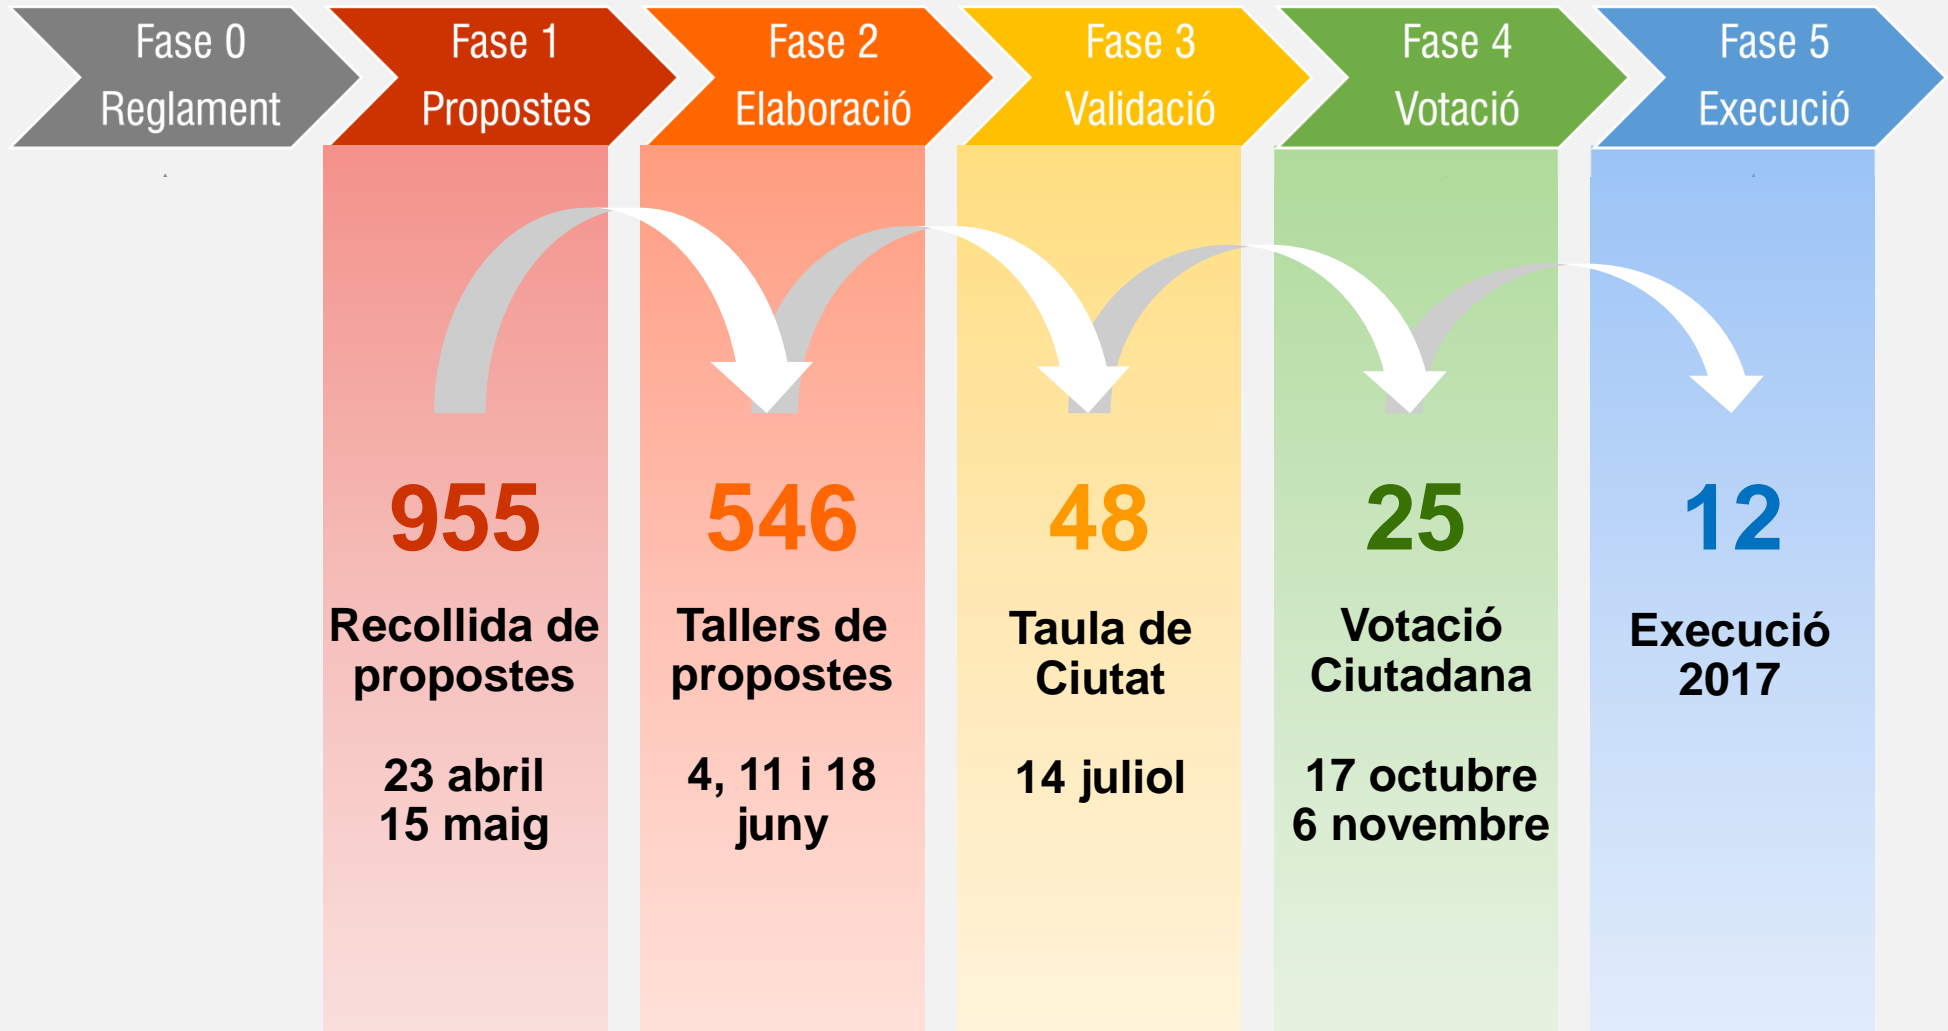

Projectes 2016-17

Projectes Grans (270.000e)

Local per les entitats de malalties neurològiques

Naturalitzar els espais de vora de Collserola

Amfiteatre als Jardins del Vallès

Itinerari per a bicicletes Rius i Tauler / Av. Graells

Millora paisatgística de l'estanyol de la Guinardera

Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Magí

Projectes Petits (50.000e)

Crear nous horts urbans i socials

Itinerari per a bici i vianants Coll Favà – Can Sant Joan

Dotar de serveis públics als parcs

Creuaments accessibles amb semàfors

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic

Pantalla acústica per a espectacles a l'aire lliure



Calendari d'execució dels projectes 2016-17

Local per les entitats de malalties neurològiques

Naturalitzar els espais de vora de Collserola

Amfiteatre als Jardins del Vallès

Itinerari per a bicicletes Rius i Tauler / Av. Graells

Millora paisatgística de l'estanyol de la Guinardera

Itinerari per a bicicletes entre el centre i Can Magí

Crear nous horts urbans i socials


Itinerari per a bici i vianants Coll Favà – Can Sant Joan

Dotar de serveis públics als parcs

Creuaments accessibles amb semàfors

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic

Pantalla acústica per a espectacles a l'aire lliure

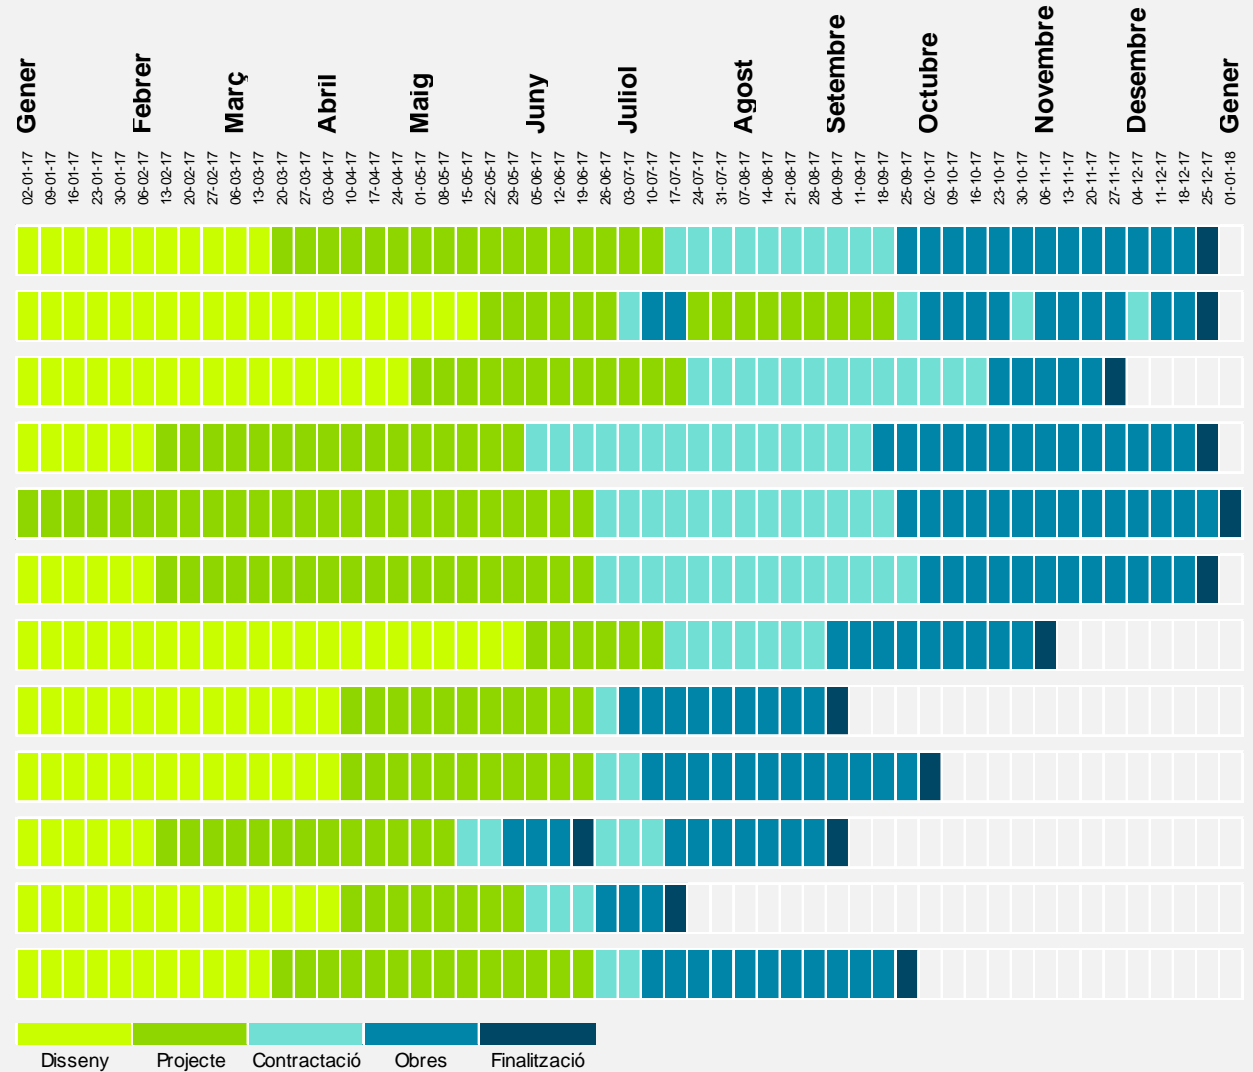



Proposta gran a executar Local per a les entitats de malalties neurològiques i càncer

2.515 vots

Local per a les entitats de malalties neurològiques i càncer

Objectiu: Crear un espai de trobada, d'activitats i de teràpies per a les persones amb malalties neurològiques (Alzheimer, Parkinson, ictus, fibromiàlgia, etc.) i les seves famílies.

Descripció: L'espai donaria cabuda a diverses entitats que treballen amb persones amb malalties neurològiques i les seves famílies i oferiria, a més de suport i teràpies, un punt de trobada tant per a les persones malaltes com per a les persones cuidadores. Un dels objectius fonamentals de l'equipament serà el de mantenir les relacions socials de les persones amb malalties neurològiques i de les seves famílies.

**Ubicació:**

Local municipal al centre de Sant Cugat

**Àmbit:**

Ciutadania

**Cost aprox.:**


270.000 €

**Termini aprox.**

execució: 18 mesos

Ajuntament
de SantCugat



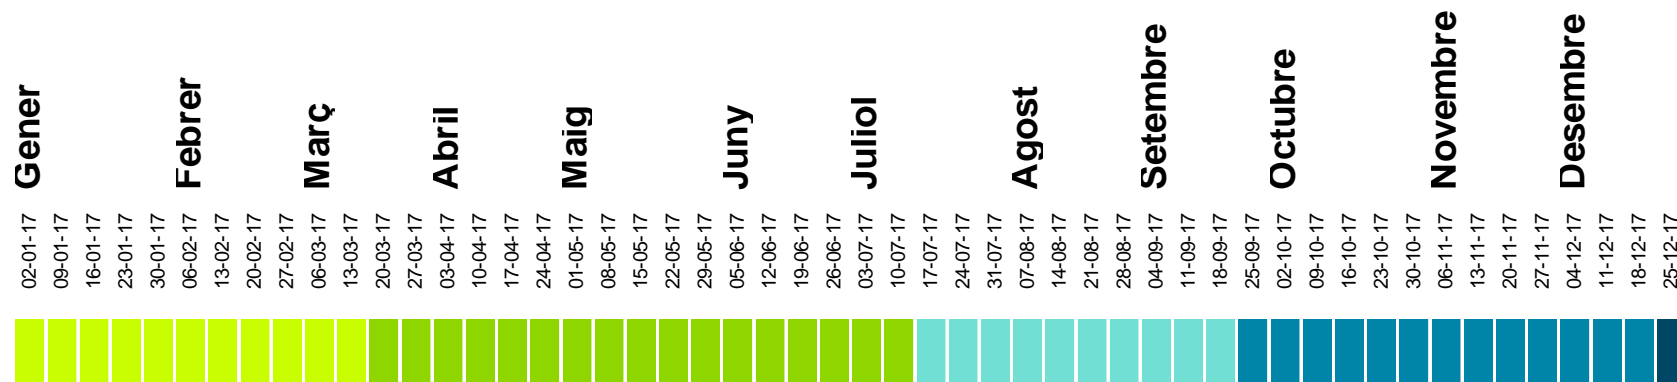

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Local municipal al centre de Sant Cugat. S'estan estudiant possibles locals al centre que permetin desenvolupar tot el programa necessari. S'estan valorant les opcions amb les entitats implicades.

Descripció

La proposta es treballa per crear un espai d'ús compartit amb les entitats relacionades amb les malalties neurològiques i càncer, amb espais equipats i sales disponibles.

Seguiment de l'execució

Novembre 2016. Des de Polítiques Socials es van definir necessitats d'usos i espais amb la Taula de Malalties Neurològiques i Càncer.



Desembre 2016. S'inicia el treball de cerca de locals, i es treballa amb les entitats.

Gener 2017. Es defineix un projecte d'espais necessaris a partir de les necessitats recollides per les entitats.

Març - abril 2017. Diverses reunions per part de Polítiques Socials amb les entitats, per valorar la ubicació del local i les necessitats. Les entitats descarten la proposta d'espai a Volpelleres per estar allunyada del centre.

Maig-juny-juliol 2017. Des de Polítiques Socials, s'estan buscant noves ubicacions cèntriques també en espais privats.



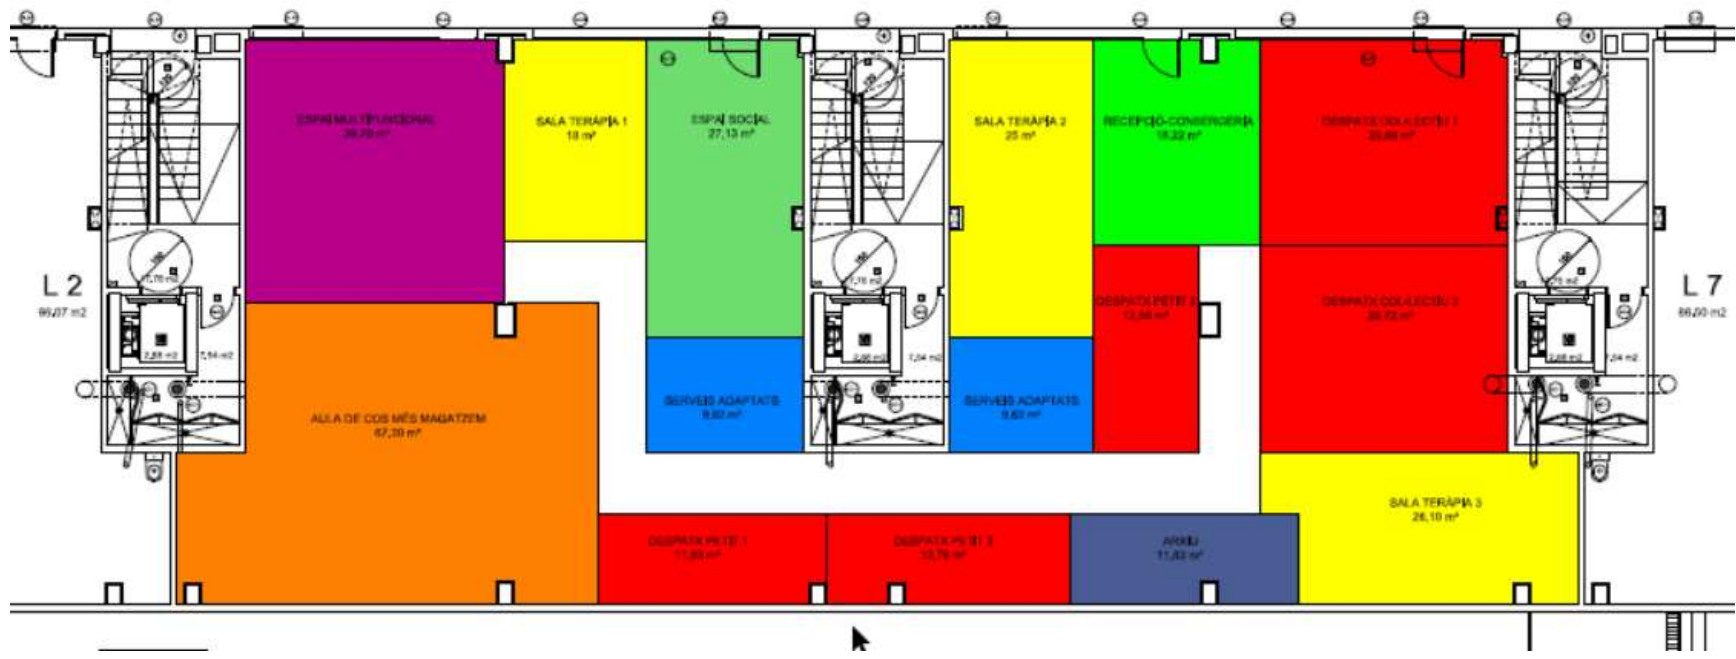




Proposta gran a executar Naturalitzar els espais de la vora de Collserola

2.499 vots

Naturalitzar els espais de la vora de Collserola

Objectiu: Millorar el contacte entre la ciutat i l'espai natural mitjançant la renaturalització dels espais de la vora per afavorir-ne el gaudi dels ciutadants i implicar-los en la conservació.

Descripció: Realitzar accions per augmentar la biodiversitat dels espais naturals mitjançant la naturalització de camins i rieres amb vegetació autòctona i de ribera i acondicionar reserves de fauna per a aus i mamífers. Augmentar el vincle ciutadà donant a conèixer Collserola des d'un punt d'informació amb voluntariat. Definir i senyalitzar nous itineraris i establir acords de conservació amb entitats.

 **Ubicació:**
Torre Negre i riera de
Crist de Llacers

 **Àmbit:**
Medi ambient

 **Cost aprox.:**
270.000 €

 **Termini aprox.
execució:** 12mesos

Ajuntament
de SantCugat





Seguiment de l'execució:

Ubicació

Entorn Torre Negra i riera de Crist de Llaceres. Als espais municipals, riera i terrenys privats amb acord del propietari.

Descripció

La proposta pretén consolidar dues entrades al Parc de Collserola (a la rotonda del Rotary i a l'Eixample), ordenar els camins, naturalitzar la riera, promoure l'agricultura, i afavorir la fauna autòctona.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016. Al grup de seguiment s'acorda les actuacions a realitzar a l'entorn del Torrent de Llacers, Torre Negra i la Riera de Sant Cugat.

Gener-maig 2017. S'han fet visites tècniques per definir àmbit, i demanant pressupostos per contractar una empresa externa per la redacció del Pla de renaturalització i d'ordenació d'usos. S'estudia l'àmbit i les possibilitats d'actuació.

Març 2017. Validació del Parc de Collserola.

Juny 2017. Adjudicació i inici del pla de renaturalització d'ordenació d'usos. Segona reunió de treball amb els proposants on es concreta calendari i es concreten possibles actuacions.

Gener

02-01-17
09-01-17

Febrer

16-01-17
23-01-17

Març

30-01-17
06-02-17
13-02-17
20-02-17
27-02-17

Abril

06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17
03-04-17
10-04-17
17-04-17

Maig

24-04-17
01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17
29-05-17

Juny

05-06-17
12-06-17
19-06-17
26-06-17

Juliol

03-07-17
10-07-17
17-07-17
24-07-17

Agost

31-07-17
07-08-17
14-08-17
21-08-17

Setembre

28-08-17
04-09-17
11-09-17
18-09-17

Octubre


25-09-17
02-10-17
09-10-17
16-10-17
23-10-17

Novembre

30-10-17
06-11-17
13-11-17
20-11-17

Desembre

27-11-17
04-12-17
11-12-17
18-12-17
25-12-17

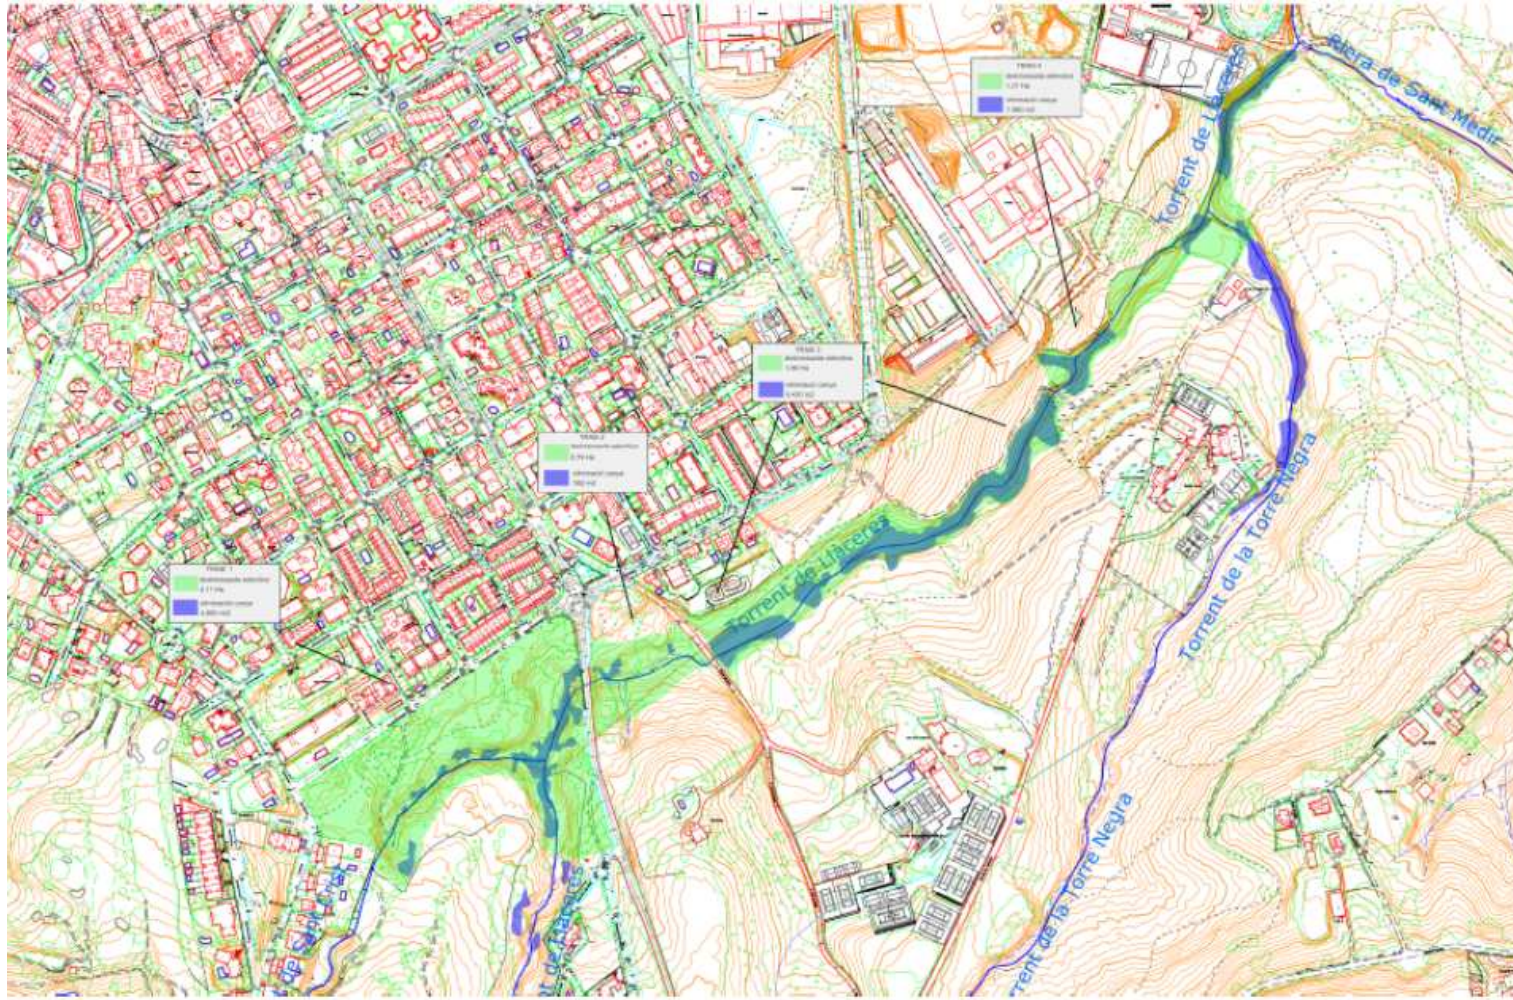



Proposta gran a executar Amfiteatre als Jardins del Vallès

1.941 vots

Amfiteatre als Jardins del Vallès

Objectiu: Renovar un parc actualment poc usat per crear-hi un amfiteatre enjardinat a l'aire lliure. Això dotaria la ciutat d'una infraestructura cultural polivalent per a espectacles.

Descripció: Condicionar un espai verd en forma d'amfiteatre per poder-hi realitzar actes culturals. L'arranjament consisteix a fer el moviment de terres, l'espai d'escenari i l'enjardinament. L'espai permetrà seure a l'herba i gaudir de l'espectacle. La seva ubicació a l'entrada de la ciutat per l'avinguda de Cerdanyola, davant el Parc de la Pollancreda, assegura un fàcil accés.



Ubicació:
Barri del Monestir



Àmbit:
Espai públic



Cost aprox.:
270.000 €



**Termini aprox.
execució:** 10mesos

Ajuntament
de SantCugat





Seguiment de l'execució:

Ubicació

Barri del Monestir, Jardins del Vallès.

Descripció

La proposta pretén ordenar tot l'espai configurant un espai per espectacles i alhora dignificar i millorar tot l'espai. Consta de tres fases: Enderroc elements constructius que fragmenten l'espai públic (pèrgola i casa de Parcs i Jardins); Moviments de terres i contenció homogènia de terres de tot l'espai per configurar les grades i altres desnivells (murs de gabions amb fusta); Millora dels jocs infantils i l'enjardinament.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016. Reunions amb veïns que alerten de possibles problemàtiques de l'amfiteatre.

Gener 2017. Estudi de l'espai i opcions d'ubicació.

Febrer 2017. Al grup de seguiment s'acorda ubicació i orientació de l'escenari i les grades. També es detallen altres actuacions de l'espai. Es recullen també consideracions de l'ús de l'espai per evitar molèsties de soroll i incivisme. Es concreten tres espais diferenciats: amfiteatre, espai infantil i jardí/parc de les olors, i el seu ordre de prioritat.

Març 2017. Treball tècnic per definir totes les condicions de l'espai i tenir en compte les consideracions dels veïns.

Maig-juny 2017. Elaboració del projecte tècnic de l'espai.

Juliol 2017. Treball d'un protocol d'ús de l'espai amb les entitats i veïnat.



Gener

02-01-17
09-01-17
16-01-17
23-01-17
30-01-17

Febrer

06-02-17
13-02-17
20-02-17
27-02-17

Març

06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17

Abril

03-04-17
10-04-17
17-04-17
24-04-17

Maig

01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17

Juny

29-05-17
05-06-17
12-06-17
19-06-17

Juliol

26-06-17
03-07-17
10-07-17
17-07-17

Agost

24-07-17
31-07-17
07-08-17
14-08-17

Setembre

21-08-17
28-08-17
04-09-17
11-09-17

Octubre


18-09-17
25-09-17
02-10-17
09-10-17


Novembre

16-10-17
23-10-17
30-10-17
06-11-17

Desembre

13-11-17
20-11-17
27-11-17
04-12-17

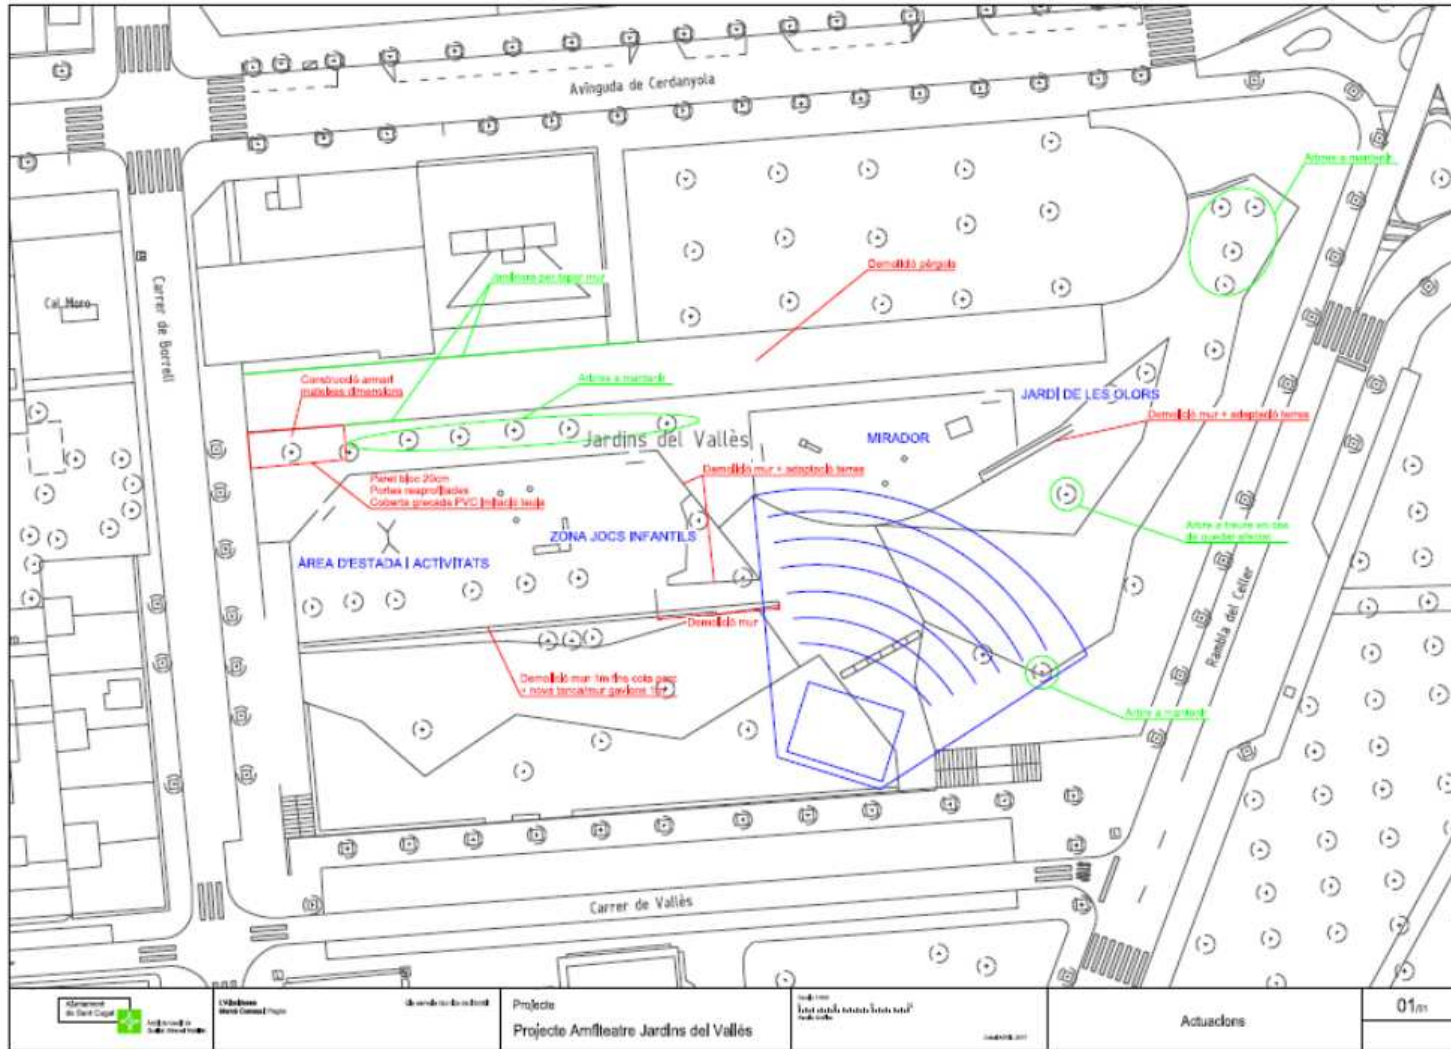

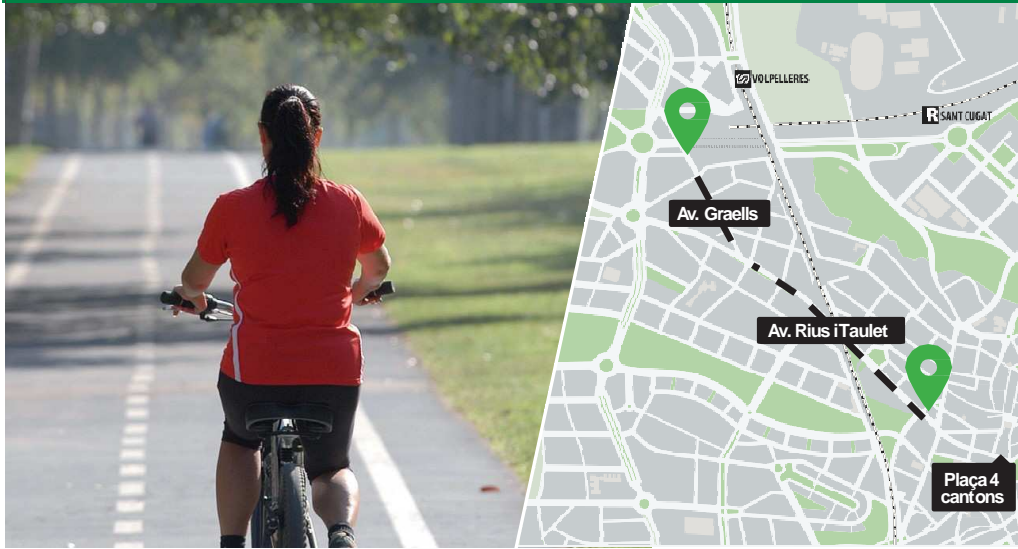


Proposta gran a executar Itinerari per a bicicletes Rius i Taullet / Av. Graells

1.793 vots

Itinerari per a bicicletes Rius i Taullet/Av. Graells

Objectiu: Itinerari segur per a bicicletes de connexió entre el centre i el barri de Volpelleres i la carretera de Rubí.

Descripció: La proposta consisteix en la creació d'un itinerari segur per a bicicletes que connecti el centre amb el barri de Volpelleres i la carretera de Rubí. Aquest itinerari es realitzarà amb la construcció d'un carril bici i pacificant el trànsit al carrer Rius i Taullet i l'avinguda Graells.

 **Ubicació:**
Carrer Rius i Taullet
i avinguda Graells

 **Àmbit:**
Mobilitat

 **Cost aprox.:**
250.000 €

 **Termini aprox.
execució:** 18mesos





Seguiment de l'execució:

Ubicació

Carrer Rius i Taulet i Avinguda Graells

Descripció

La proposta connecta el centre amb Volpelleres. Es concreta treien un sentit de circulació i mantenint aparcament a l'Av Graells, realitzant un tram de carril bici a Rius i Taulet i fent una connexió fins al Parc Central per al C/ Pere Serra.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016 - gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d'elaboració de propostes.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb grup motor i reelaboració de propostes. Prioritzant començar per l'Av Graells. I el de Rius i Taulet valorar el carril amb el projecte de carril de tot el C/Rius i Taulet

Abril 2017. Informació als Veïns. Informar als veïns afectats mitjançant carta. Veïns de l'entorn de Av Graells del projecte que afecta als sentits de circulació i alhora permet reduir trànsit de pas. S'han rebut alguns correus aportant comentaris al projecte,

Maig 2017. Elaboració del projecte i incorporació de les peticions del veïnat.

Juny-Juliol 2017. Licitació i adjudicació dels treballs.

Setembre. Inici obres, durada prevista dos mesos.



Gener

02-01-17

09-01-17

16-01-17

23-01-17

30-01-17

Febrer

06-02-17

13-02-17

20-02-17

27-02-17

Març

06-03-17

13-03-17

20-03-17

27-03-17

Abril

03-04-17

10-04-17

17-04-17

24-04-17

Maig

01-05-17

08-05-17

15-05-17

22-05-17

29-05-17

Juny

05-06-17

12-06-17

19-06-17

26-06-17

Juliol

03-07-17

10-07-17

17-07-17

24-07-17

31-07-17

Agost

07-08-17

14-08-17

21-08-17

28-08-17

Setembre

04-09-17

11-09-17

18-09-17

25-09-17

Octubre

02-10-17

09-10-17

16-10-17

23-10-17

30-10-17

Novembre

06-11-17

13-11-17

20-11-17

27-11-17



Desembre

04-12-17

11-12-17

18-12-17

25-12-17

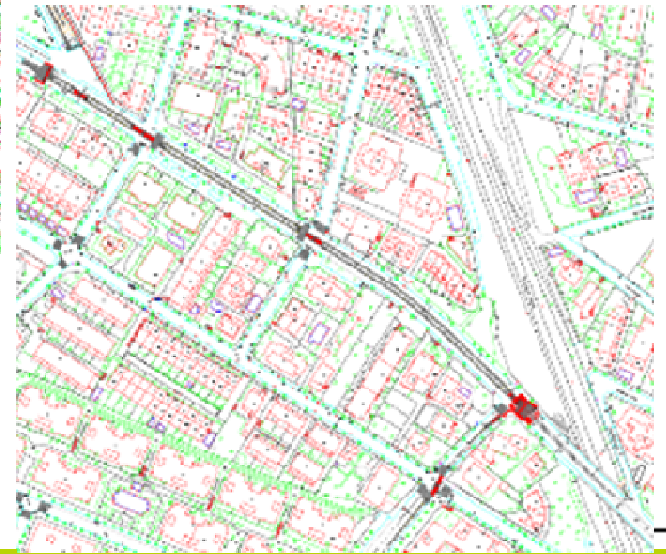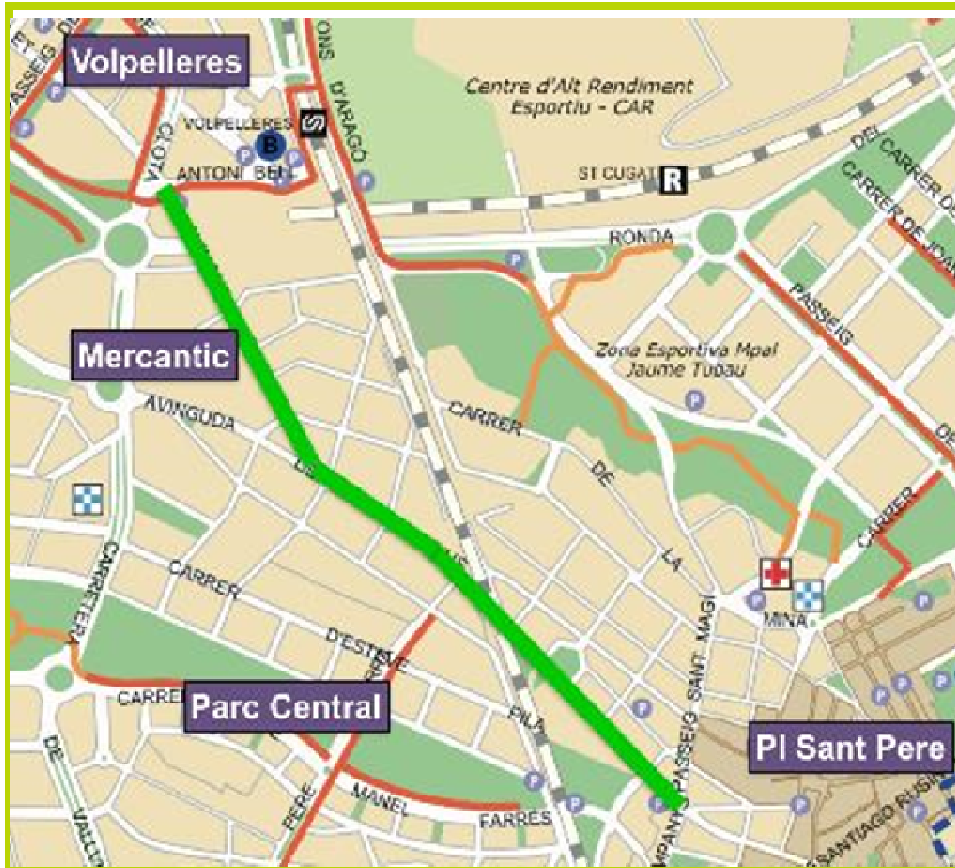



Proposta gran a executar Millora paisatgística de l'estanyol de la Guinardera

1.754 vots

Millora paisatgística de l'estanyol de la Guinardera

Objectiu: Restauració de tot l'entorn de l'estanyol per a la seva millora paisatgística que permeti gaudir de la seva vegetació i observar la fauna autòctona.

Descripció: Restauració per a la millora paisatgística, manteniment del paper faunístic de l'estany (amb espais de protecció de la fauna), millora d'accessos i zones d'estada. Potenciació d'itineraris didàctics i naturalístics senyalitzats, creació d'espais per a l'ús social integrat i restauració del vas de l'estany, molt degradat.

**Ubicació:**

Estany de la Guinardera
(Costat C.Comercial)

**Àmbit:**

Espai públic

**Cost aprox.:**


270.000 €

**Termini aprox.
execució:**

2 anys

Ajuntament
de SantCugat



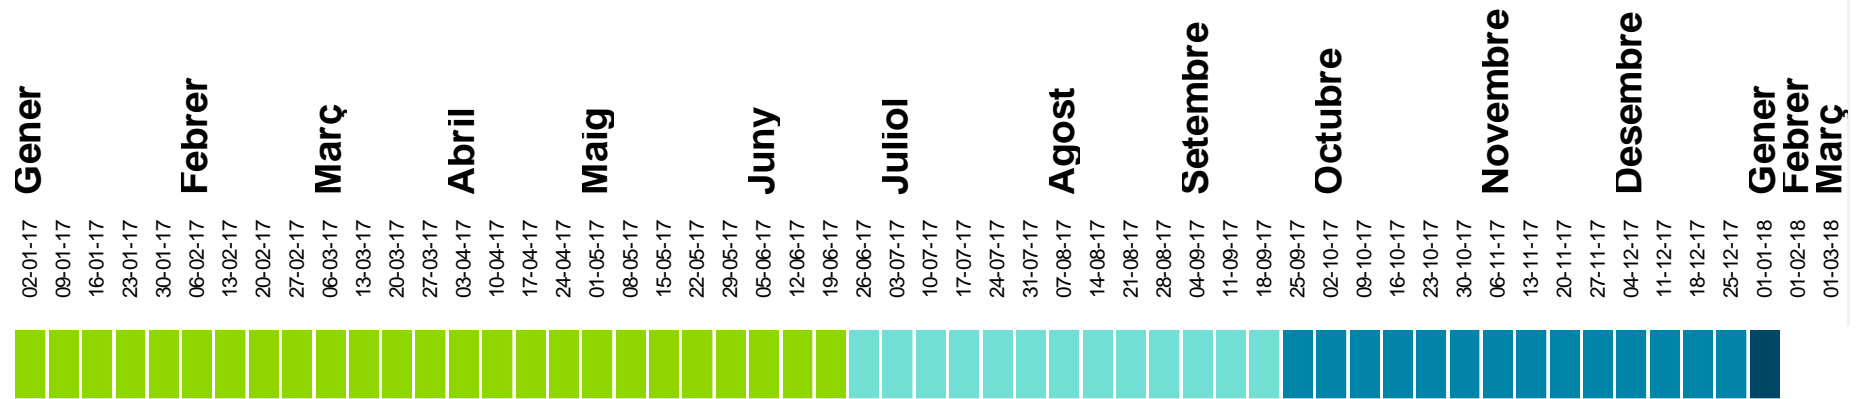

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Estany de la Guinardera (Costat C. Comercial)

Descripció

La proposta cerca millorar l'estat del vas de l'estanyol (fent el dragat, substituint les làmines impermeables); naturalitzar les vores, millorar els accessos i establir un espai d'estada.

Seguiment de l'execució:

Novembre 2016. El projecte consta de dos parts: Restauració del vas de l'Estanyol. Instal·lant una nova impermeabilització, que s'assumeix des del pressupost propi del Servei de Parcs i Jardins. I la millora i condicionament de l'entorn de l'Estanyol que correspon a la proposta sorgida als Pressupostos Participatius 2016-17. S'estudien opcions.

Gener 2017. Reunió amb els proposants per definir les actuacions de millora i condicionament.

Febrer –maig 2017. Redacció del projecte.

Juny 2017. Projecte redactat i ja en procés de contractació de la obra.

Gener

02-01-17
09-01-17
16-01-17
23-01-17
30-01-17

Febrer

06-02-17
13-02-17
20-02-17
27-02-17

Març

06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17

Abril

03-04-17
10-04-17
17-04-17
24-04-17

Maig

01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17
29-05-17

Juny

05-06-17
12-06-17
19-06-17
26-06-17

Juliol

03-07-17
10-07-17
17-07-17
24-07-17
31-07-17

Agost

07-08-17
14-08-17
21-08-17
28-08-17

Setembre

04-09-17
11-09-17
18-09-17
25-09-17

Octubre

02-10-17
09-10-17
16-10-17
23-10-17
30-10-17

Novembre

06-11-17
13-11-17
20-11-17
27-11-17

Desembre

04-12-17
11-12-17
18-12-17
25-12-17

**Gener
Febrer
Març**

01-01-18
01-02-18
01-03-18





Proposta gran a executar
**Itinerari per a bicicleta
 entre el centre i Can Magí**

1.505 vots

Itinerari per a bicicleta entre el centre i Can Magí

Objectiu: Crear un itinerari segur per a bicicletes que connecti el centre amb l'Escola Oficial d'Idiomes, l'escola Collserola, l'IES Pla i Farreras i el camp de futbol Can Magí.


Descripció: La proposta consisteix en la creació d'un itinerari segur per a bicicletes que connecti el centre (Av. Francesc Macià) amb el barri de Sant Francesc i els seus equipaments principals. Aquest itinerari es realitzarà amb la construcció d'un carril bici i espais pacificats de convivència en diferents trams que actualment no estan connectats. Millora la connexió amb bicicleta del centre amb la zona de Can Magí.

 **Ubicació:**
 Sant Francesc

 **Àmbit:**
 Mobilitat

 **Cost aprox.:**
 225.000 €

 **Termini aprox.
 execució:** 18mesos

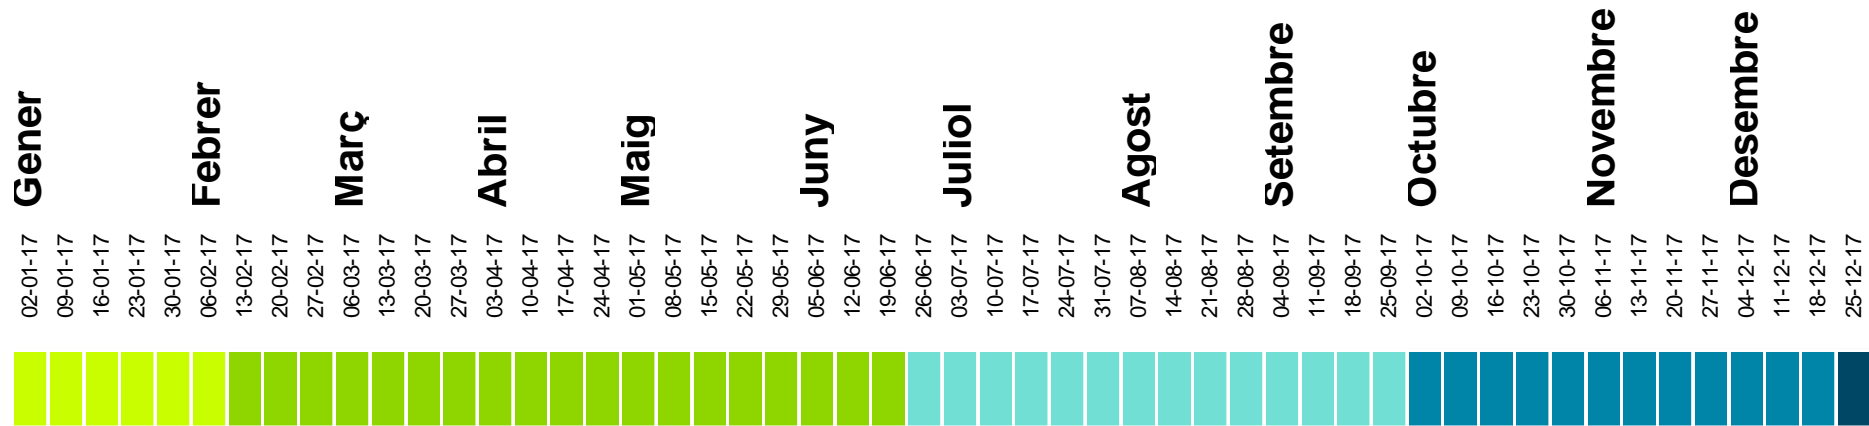

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Sant Francesc

Descripció

La proposta dona servei als veïns del Barri del Monestir, St Francesc i Can Magí i als equipaments educatius i esportius de la zona. El seu traçat passa per carrers existents i per zones verdes.

Seguiment de l'execució:


Desembre 2016 – gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d'elaboració de traçat de carril.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb grup motor i reelaboració de propostes. Es detalla la proposta de materialització del carril i pressupost.

Abril 2017. Reunió informativa del projecte als veïns dels trams del carril i als centres educatius beneficiaris de la proposta.

Maig. Redacció del projecte final amb la incorporació de totes les consideracions sorgides amb els agents locals.

Juny 2017. Inici de la licitació de les obres amb procediment obert.

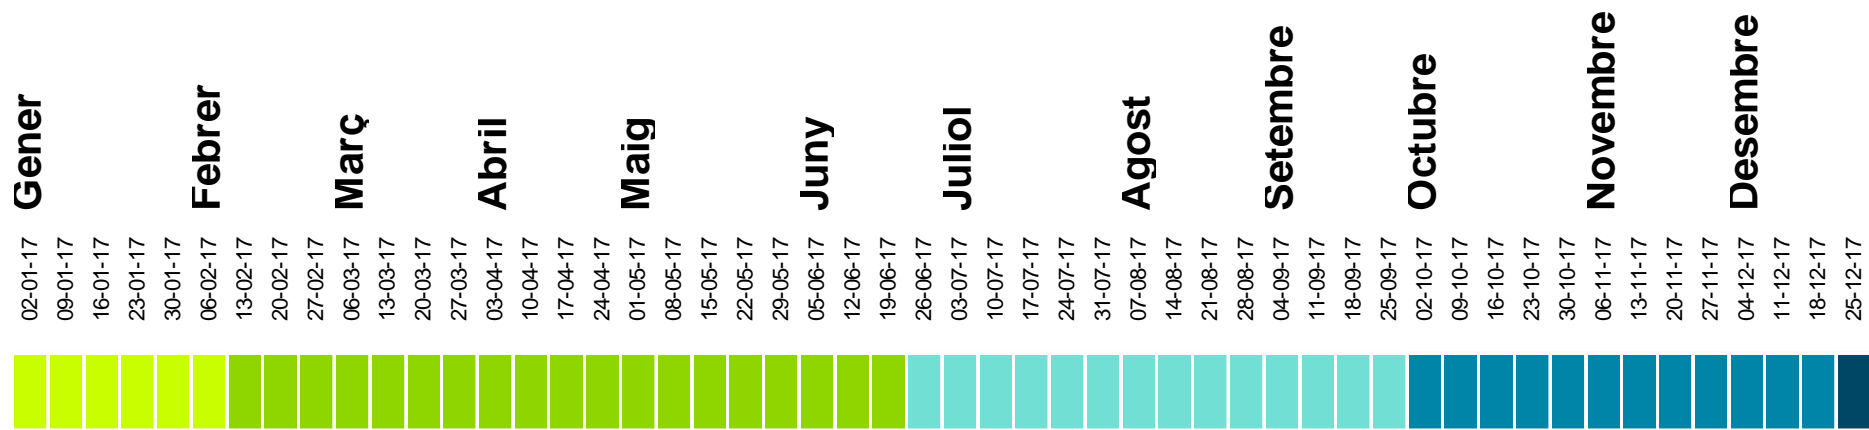



Proposta petita a executar Crear nous horts urbans i socials

2.411 vots

Crear nous horts urbans i socials

Objectiu: Afavorir el cultiu d'horts per millorar la qualitat de vida i generar nous espais de trobada a l'aire lliure i relació intergeneracional, tot augmentant la riquesa paisatgística.

Descripció: Identificar nous espais verds urbans per adequar-los com a horts ecològics d'ús comunitari. Comporta les despeses de l'adquisició de la tanca perimetral, una caseta per guardar-hi les eines, aportacions de matèria orgànica per millorar la qualitat del sòl, etc. L'hort serà gestionat per una associació, la qual adquirirà el dret d'ús a través d'un concurs públic.

**Ubicació:**

Monestir - Sant
Francesc i La Floresta

**Àmbit:**

Medi ambient

**Cost aprox.:**

50.000 €

**Termini aprox.**

execució: 12mesos

Ajuntament
de SantCugat





Seguiment de l'execució:

Ubicació

Monestir - Sant Francesc i La Floresta

Descripció

La proposta s'ha concretat a través de diversos terrenys municipals incorporats al Programa d'horts urbans Cultiva't. Els quals seran gestionats per entitats de caire social i veïnal.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016. Al grup de seguiment es defineixen possibles solars públics per a cedir a les entitats dins del Programa cultiva't.

Gener 2017. Es prepara el concurs d'horts sobre tres solars. Es fan reunions amb entitats dels barris per engrescar-les a presentar-se i oferir suport, alhora que definir els solars. En el cas de la Floresta es fa també reunió amb la presidència del Consell de barri.

Març 2017. Es publica el concurs. Un període de 1,5 mesos per presentar els projectes. El termini per presentar projectes finalitza el 16 de maig.

Juny 2017. Adjudicacions definitives a les entitats i valoració i tancament dels projectes amb cada una d'elles. La Floresta no s'ha presentat cap entitats.

Juny 2017. Definició dels projectes d'adequació de l'espai amb les propostes de les entitats.

Gener

02-01-17
09-01-17
16-01-17

Febrer

23-01-17
30-01-17
06-02-17
13-02-17

Març

20-02-17
27-02-17
06-03-17
13-03-17

Abril

20-03-17
27-03-17
03-04-17
10-04-17

Maig

17-04-17
24-04-17
01-05-17
08-05-17

Juny

15-05-17
22-05-17
29-05-17
05-06-17

Juliol

12-06-17
19-06-17
26-06-17
03-07-17

Agost

10-07-17
17-07-17
24-07-17
31-07-17

Setembre

07-08-17
14-08-17
21-08-17
28-08-17

Octubre

04-09-17
11-09-17
18-09-17
25-09-17

Novembre


02-10-17
09-10-17
16-10-17
23-10-17

Desembre

30-10-17
06-11-17
13-11-17
20-11-17

27-11-17
04-12-17
11-12-17
18-12-17

25-12-17

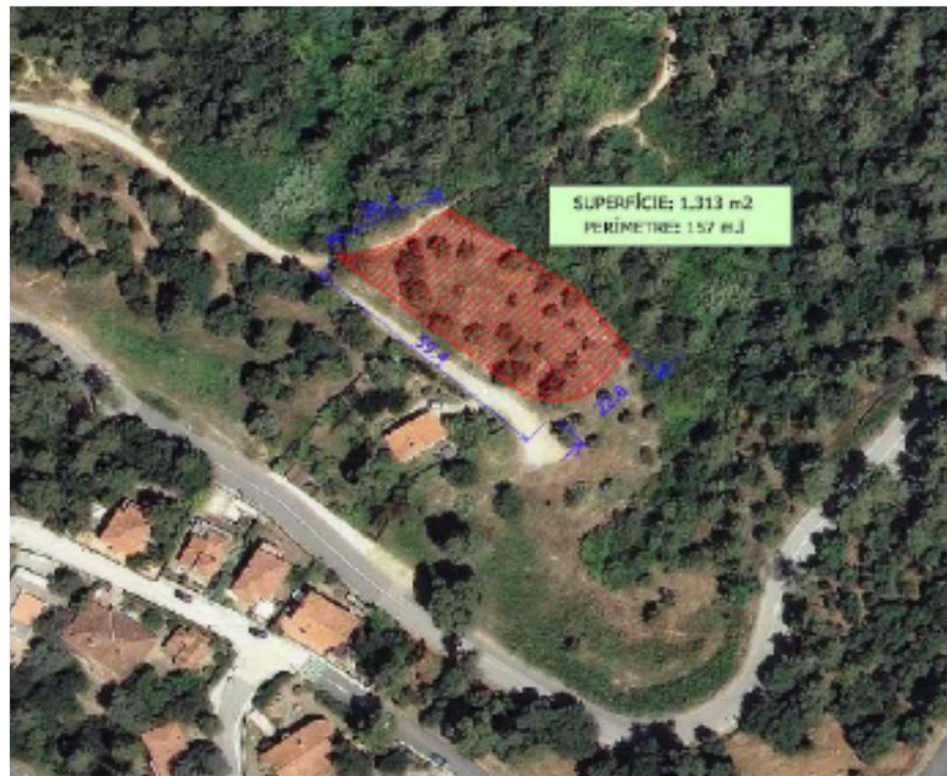




Proposta petita a executar Itinerari per a bici i vianants Coll Favà-Can Sant Joan

2.119 vots

Itinerari per a bici i vianants Coll Favà-Can Sant Joan

Objectiu: Crear un itinerari segur per a bicicletes i vianants que connecti el barri de Coll Favà amb l'avinguda Via Augusta i l'avinguda Alcalde Barnils, a l'inici de Can Sant Joan.

Descripció: La proposta consisteix en la conversió del camí de Sant Cugat a Sabadell a un únic sentit de circulació i aprofitar l'espai sobrant per fer-hi un camí segur per a bicicletes i vianants. També preveu un accés directe del camí de Sabadell a l'estació de RENFE. Facilitarà un accés amb bicicleta i a peu a tots els equipaments educatius, empreses i serveis del polígon Can Sant Joan.


 **Ubicació:**
Coll Favà - Can Sant Joan

 **Àmbit:**
Mobilitat

 **Cost aprox.:**
45.000 €

 **Termini aprox. execució:** 6 mesos



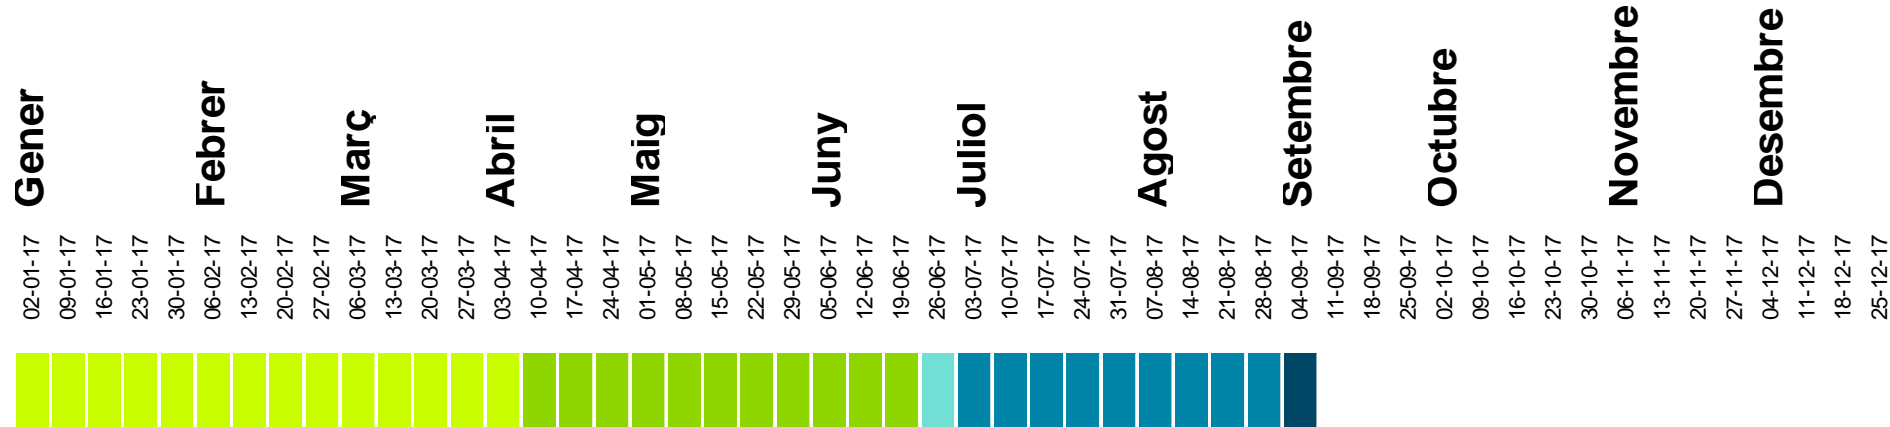

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Coll Favà - Can Sant Joan

Descripció

El carril facilita el desplaçament des de Coll Favà fins a Can Sant Joan. S'ha reordenat els sentits de circulació i s'ha incorporat el carril bici.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016 – gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d'elaboració de propostes de traçat del carril bici i vianants.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb grup motor i reelaboració de propostes. A la segona reunió del grup de seguiment s'acorda el projecte.

Abril - maig 2017. Redacció del projecte final.

Juny - Licitació obres.



Gener

02-01-17
09-01-17
16-01-17
23-01-17
30-01-17

Febrer

06-02-17
13-02-17
20-02-17
27-02-17

Març

06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17

Abril

03-04-17
10-04-17
17-04-17
24-04-17

Maig

01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17

Juny

29-05-17
05-06-17
12-06-17
19-06-17

Juliol

26-06-17
03-07-17
10-07-17
17-07-17

Agost

24-07-17
31-07-17
07-08-17
14-08-17

Setembre

21-08-17
28-08-17
04-09-17
11-09-17

Octubre


18-09-17
25-09-17
02-10-17
09-10-17

Novembre

16-10-17
23-10-17
30-10-17
06-11-17

Desembre

13-11-17
20-11-17
27-11-17
04-12-17
11-12-17
18-12-17
25-12-17

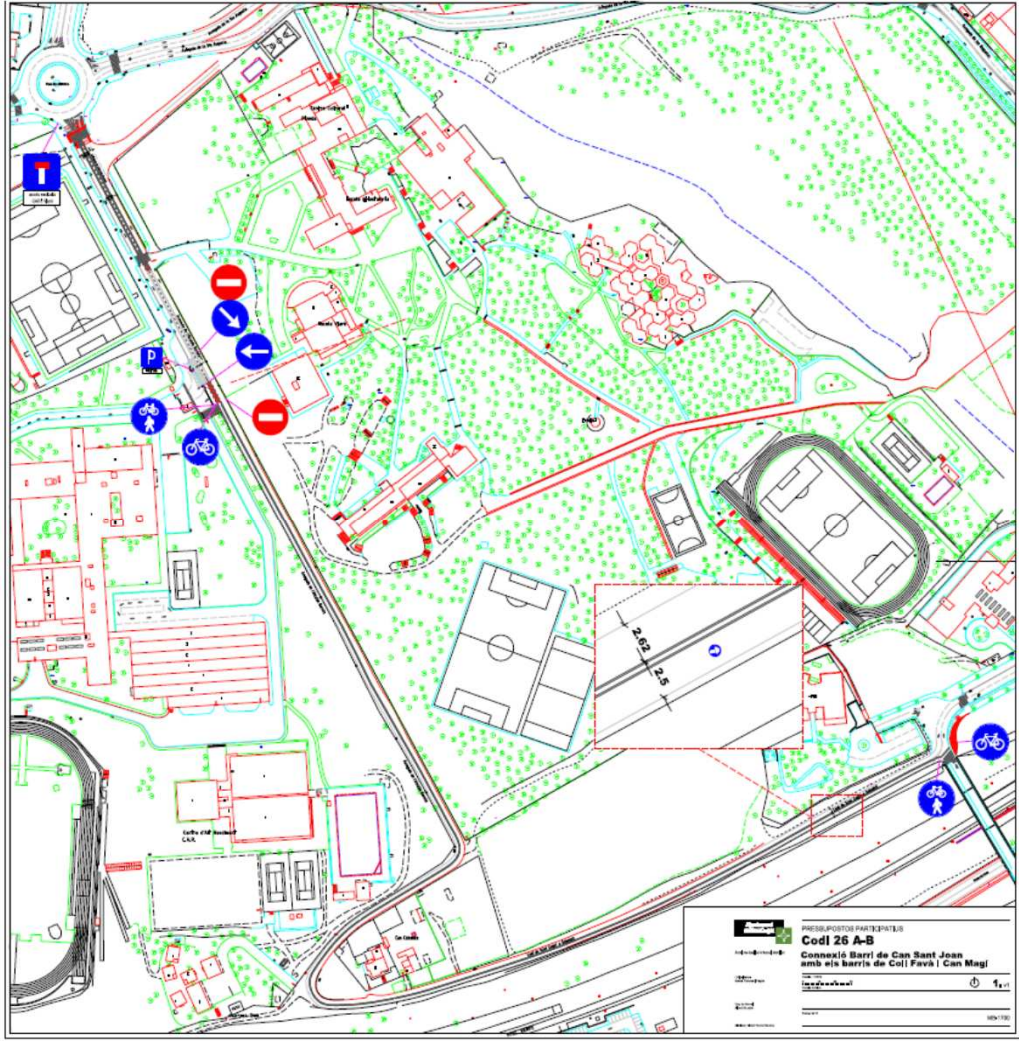



Proposta petita a executar Dotar de serveis públics els parcs

2.083 vots

Dotar de serveis públics els parcs

Objectiu: Dotar de serveis públics els parcs i les places de la ciutat amb més afluència.

Descripció: La proposta passa per dotar de serveis públics alguns parcs i places mitjançant la instal·lació de mòduls prefabricats i/o d'obra, segons el lloc. Els mòduls incorporaran cambres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i autoneteja. La proposta pretén evitar l'incivisme als parcs i donar servei a la població, en especial a la gent gran i als infants.



Ubicació:

Plaça del Rei, Parc de Can Matas, Pollancreda



Àmbit:

Espai públic




Cost aprox.:
50.000 euros



Termini aprox. execució: 18mesos

Ajuntament
de SantCugat



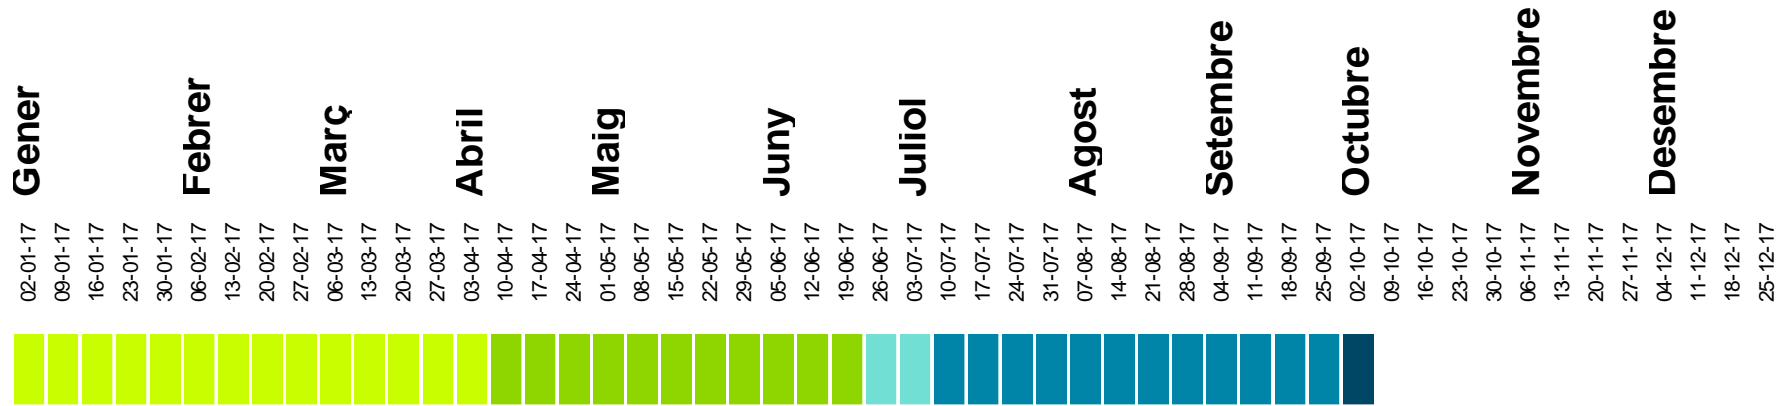

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Parc de Can Mates

Descripció

La proposta consisteix en la instal·lació d'un mòdul de banys fixes al Parc de Can Mates.

Seguiment de l'execució:

Gener 2017. S'estudien opcions tècniques.

Febrer 2017. Al grup de seguiment es treballen dos emplaçaments: Turó de Can Mates i Plaça del Rei. Es prioritza el primer per no haver-hi alternatives de restauració a la vora.

Març 2017. Recerca de sistemes constructius i estudi de localitzacions possibles.

Abril 2017. Treball del projecte de mòdul i connexió a les xarxes de sanejament, aigua i llum.

Juny. Contractació dels treballs per dotar d'infraestructures els lavabos així com la construcció dels mateixos..



Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost


Setembre

Octubre


Novembre

Desembre

02-01-17 09-01-17 16-01-17 23-01-17 30-01-17 06-02-17 13-02-17 20-02-17 27-02-17 06-03-17 13-03-17 20-03-17 27-03-17 03-04-17 10-04-17 17-04-17 24-04-17 01-05-17 08-05-17 15-05-17 22-05-17 29-05-17 05-06-17 12-06-17 19-06-17 26-06-17 03-07-17 10-07-17 17-07-17 24-07-17 31-07-17 07-08-17 14-08-17 21-08-17 28-08-17 04-09-17 11-09-17 18-09-17 25-09-17 02-10-17 09-10-17 16-10-17 23-10-17 30-10-17 06-11-17 13-11-17 20-11-17 27-11-17 04-12-17 11-12-17 18-12-17 25-12-17

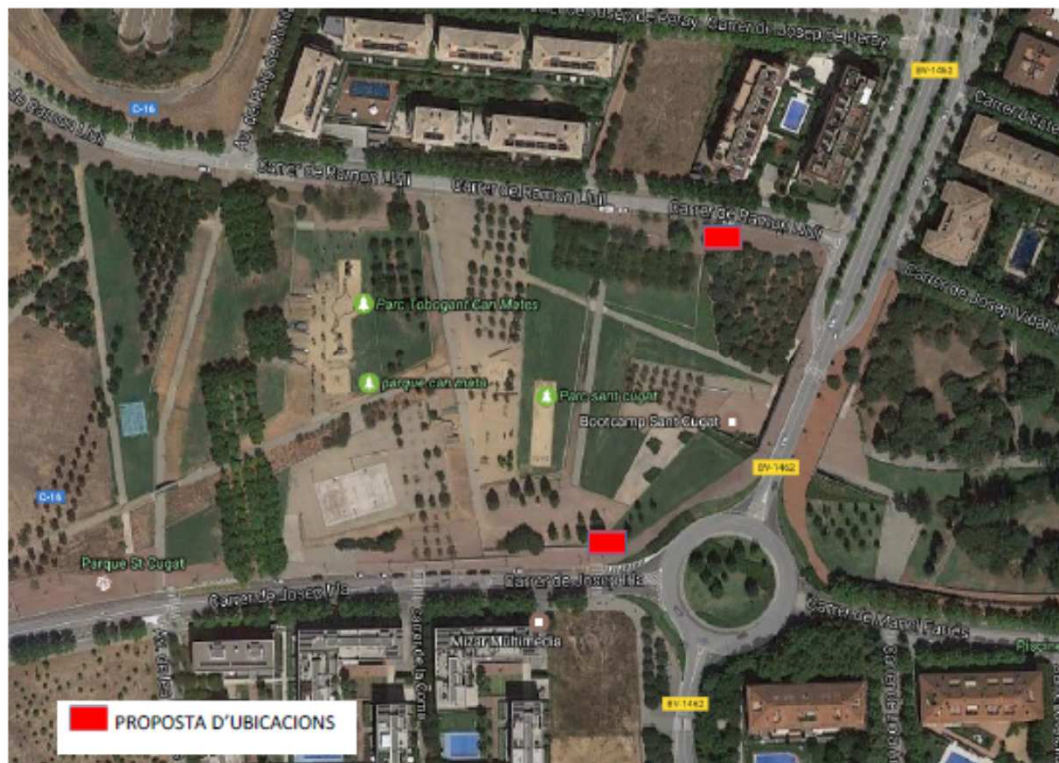

- Pendent ubicació definitiva (limitació xarxa de clavegueram)
- Possibilitat de disseny segons ajuntament
- Diferents tipologies de material a utilitzar (fusta, vidre, tauler HPL)
- 2 mesos de lliurament des de l'encàrrec
- Obres auxiliars (connexions a les xarxes d'enllumenat, clavegueram i aigua)

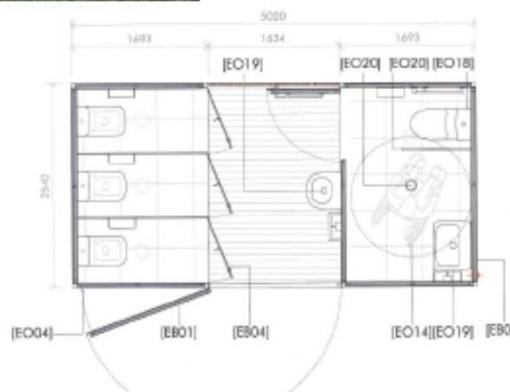

materials

predefinit

altres exteriors



exterior/interior: tauler HPL



fueta natural



fueta tecnològica



vidre



alumini ondat

Ajuntament de SantCugat





Proposta petita a executar Creuaments accessibles amb semàfors

1.825 vots

Creuaments accessibles amb semàfors

Objectiu: Fer accessibles els creuaments amb semàfors per a invidents i persones amb mobilitat reduïda.

Descripció: La proposta consisteix a instal·lar el mòdul de semàfor per a invidents en els semàfors que encara no el tenen i millorar l'accessibilitat dels rebaixos dels passos de vianants. La finalitat és millorar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda.

**Ubicació:**

Arreu del municipi on hi ha semàfors

**Cost aprox.:**

50.000 euros

**Àmbit:**


Mobilitat

**Termini aprox.**

execució: 12mesos

Ajuntament
de SantCugat



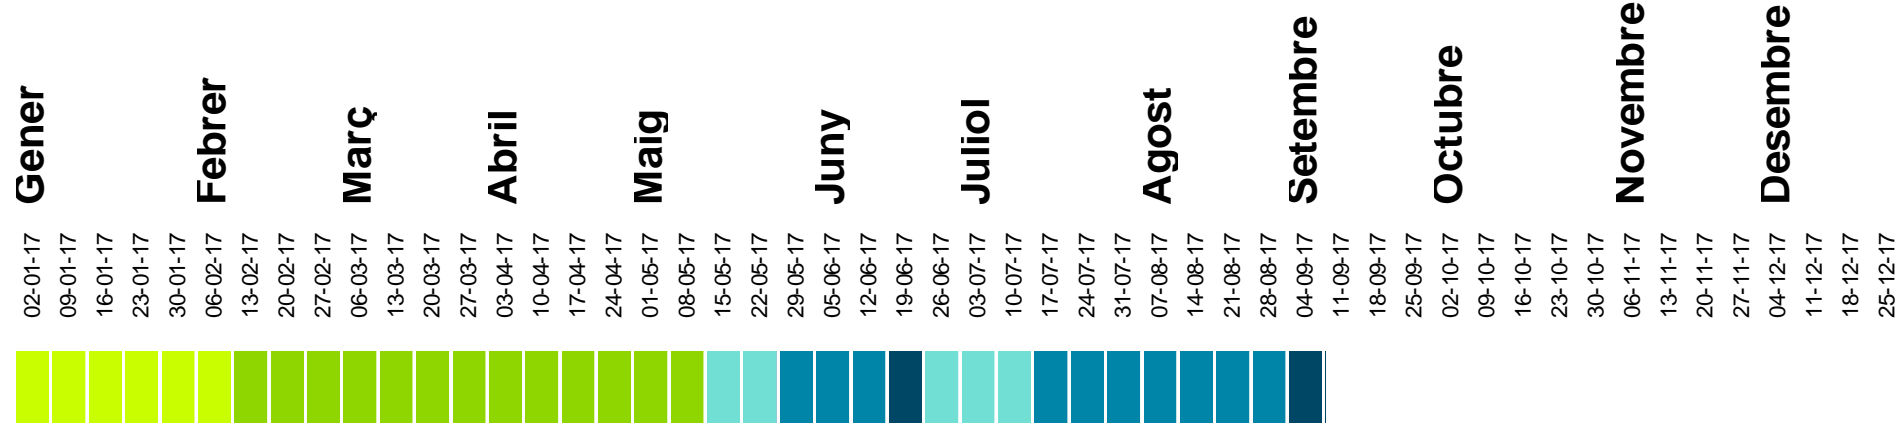

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Els semàfors que encara no estan adaptats i els passos prioritzats per la Taula de mobilitat reduïda.

Descripció

La proposta implica l'adaptació per a invidents de 3 semàfors i 10 rebaixos a voreres.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016 – gener 2017. Treball Intern. Primer treball tècnic intern d'elaboració de propostes de traçat del carril bici i vianants.

Gener - març 2017. Consens grup motor. Reunions amb promotor i Taula de la Mobilitat Reduïda i reelaboració de propostes. Identificació dels creuaments: 3 semàfors i 10 rebaixos a voreres per fer els encaminaments. S'inicia encàrrec dels semàfors.

Març-maig. Redacció del projecte de rebaixos i encaminaments.

Juny 2017. Licitació i adjudicació obres.

Juliol. 2017. Inici obres, durada prevista 1 mes.



Gener

02-01-17
09-01-17
16-01-17
23-01-17

Febrer

30-01-17
06-02-17
13-02-17
20-02-17
27-02-17

Març

06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17

Abril

03-04-17
10-04-17
17-04-17
24-04-17

Maig

01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17
29-05-17

Juny

05-06-17
12-06-17
19-06-17
26-06-17

Juliol

03-07-17
10-07-17
17-07-17
24-07-17

Agost

31-07-17
07-08-17
14-08-17
21-08-17

Setembre

28-08-17
04-09-17
11-09-17
18-09-17

Octubre


25-09-17
02-10-17
09-10-17
16-10-17
23-10-17

Novembre

30-10-17
06-11-17
13-11-17
20-11-17

Desembre

27-11-17
04-12-17
11-12-17
18-12-17
25-12-17

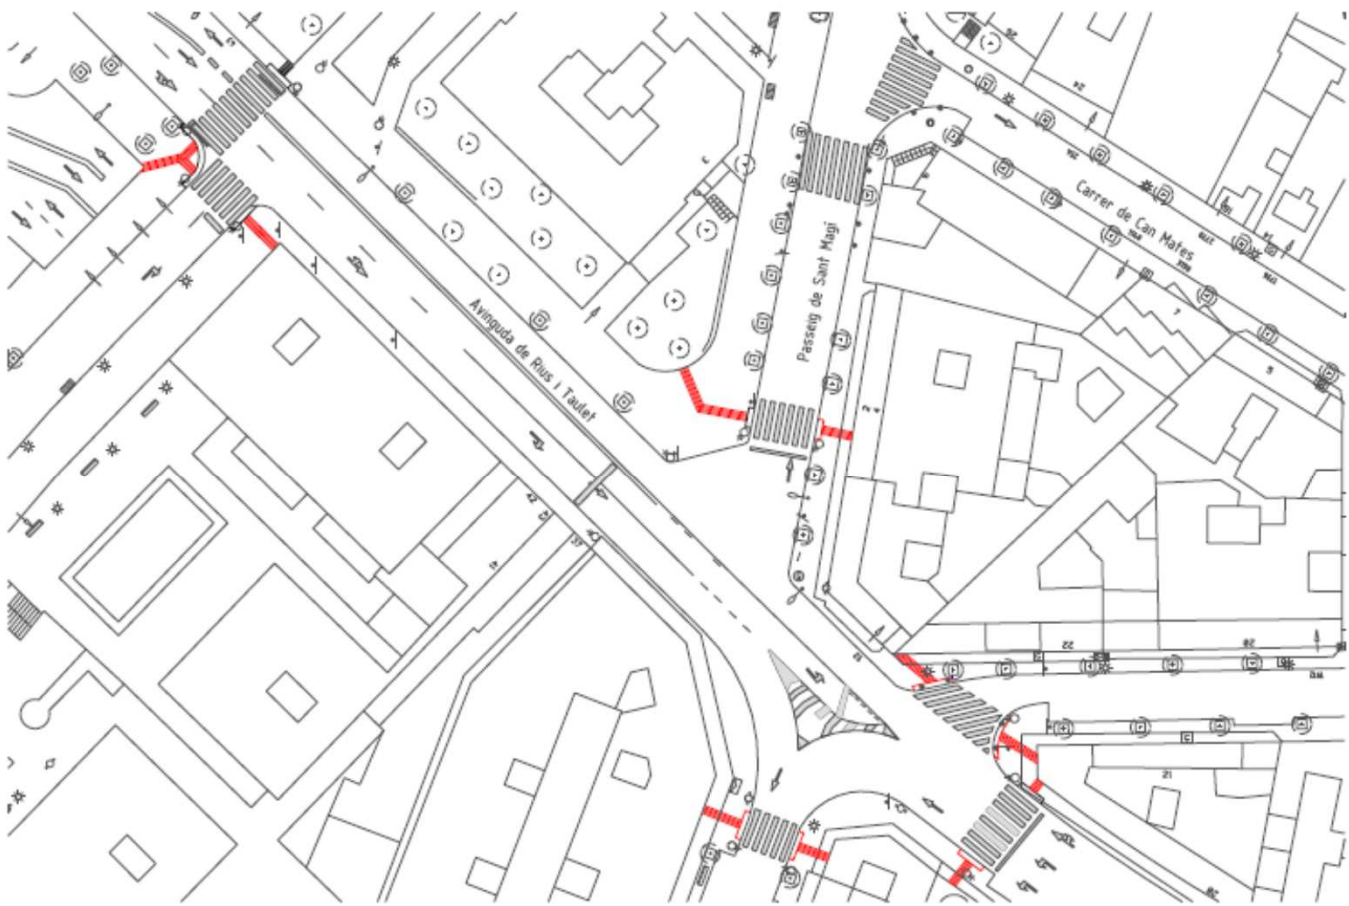

— Actuació





Proposta petita a executar Circuits de salut amb aparells de manteniment físic

1.589 vots

Circuits de salut amb aparells de manteniment físic

Objectiu: Facilitar l'exercici físic i promoure l'envelliment actiu d'adults i gent gran a partir de la instal·lació d'aparells de manteniment a l'aire lliure.

Descripció: Instal·lació de mobiliari urbà per realitzar exercicis de manteniment físic per a adults i gent gran. S'ubicaran en espais públics existents per facilitar l'accés a tota la població, permetre fer exercici físic al llarg del dia, gaudir de l'aire lliure i afavorir la relació i la creació de grups espontanis. Es proposa la creació de dos circuits d'aparells en dos parcs públics de la ciutat.

**Ubicació:**

Residència Sant Cugat,
Monestir i Mira-sol

**Àmbit:**

Esports i qualitat
urbana

**Cost aprox.:**


45.000 €

**Termini aprox.**

execució: 6 mesos

Ajuntament
de SantCugat



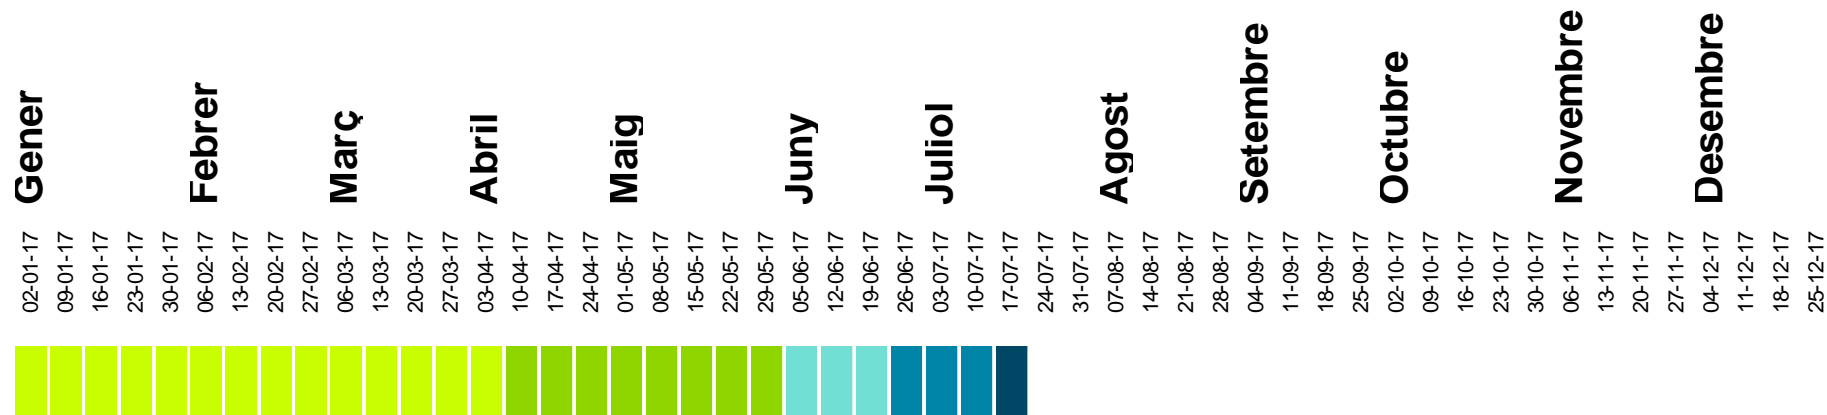

Seguiment de l'execució:

Ubicació

Barri del Monestir proper a la Residència Sant Cugat, i Barri de Mira-sol a Can Mates

Descripció

Es configuren dos circuits de salut per a persones adultes actives amb diferents aparells de baixa resistència i que permeten fer els moviments amb seguretat. S'ha acordat amb el veïnat el tipus d'aparells més convenient a cada zona.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016. Treball de propostes d'aparells i pressupostos, i ubicacions a espais públics.

Febrer 2017. Grups de treball on s'acorda les propostes d'ubicacions: al Barri del Monestir a espais públics propers a la Residència de Santa Rosa. A Mira-sol a Can Mates a l'entorn de la Masia de Can Rabella.

Març 2017. Es treballa en detall les ubicacions i possibles aparells.

Abril-maig 2017. Definició dels projectes. I noves reunions per acordar el projecte final.

Juny 2017. Adjudicació dels projectes.

Juliol-agost 2017. Instal·lació.



Gener

02-01-17
09-01-17
16-01-17
23-01-17
30-01-17

Febrer

06-02-17
13-02-17
20-02-17
27-02-17

Març

06-03-17
13-03-17
20-03-17
27-03-17

Abril

03-04-17
10-04-17
17-04-17
24-04-17

Maig

01-05-17
08-05-17
15-05-17
22-05-17
29-05-17

Juny

05-06-17
12-06-17
19-06-17
26-06-17

Juliol

03-07-17
10-07-17
17-07-17
24-07-17

Agost

31-07-17
07-08-17
14-08-17
21-08-17

Setembre

28-08-17
04-09-17
11-09-17
18-09-17

Octubre

25-09-17
02-10-17
09-10-17
16-10-17
23-10-17


Novembre

30-10-17
06-11-17
13-11-17
20-11-17

Desembre

27-11-17
04-12-17
11-12-17
18-12-17
25-12-17



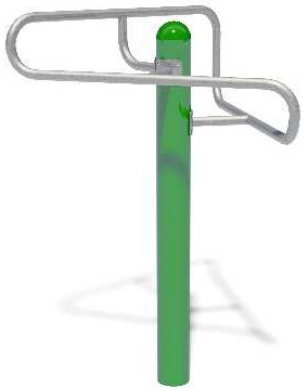

1. Leg Stretch



2. Twister



3. Push Hands



4 i 5. Sky Stepper



6. Air Walker




7. Lat Pull and
Chess Press



8. Trinity Cycle



6. Air Skier

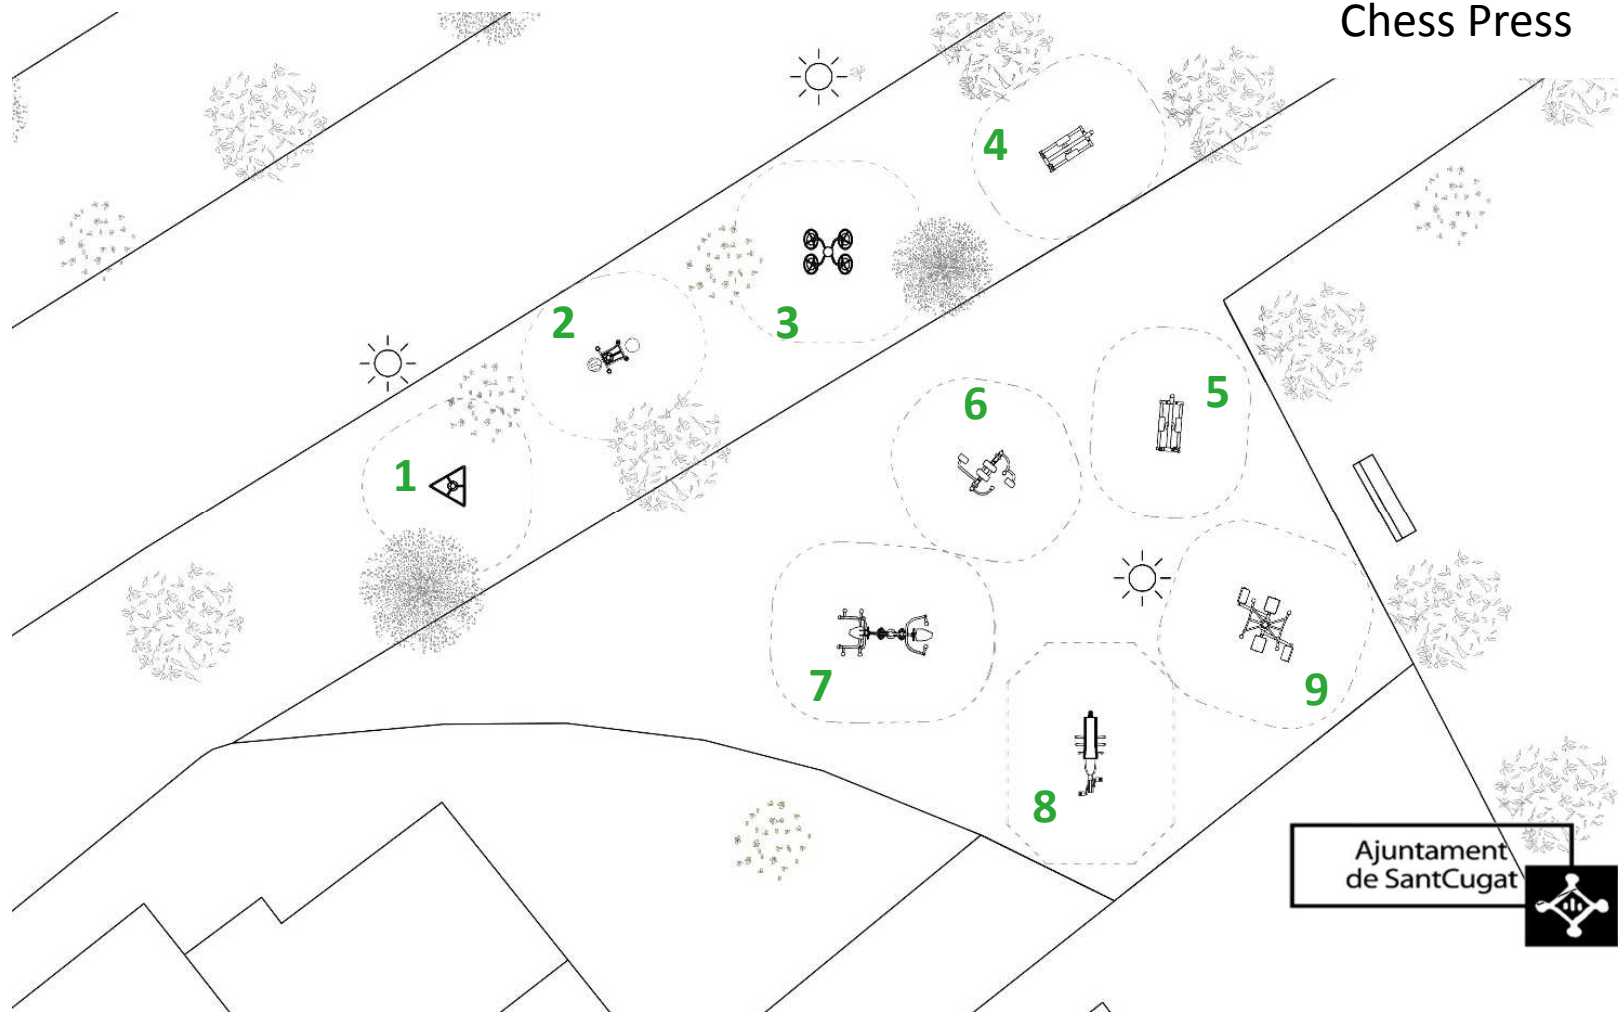



Proposta petita a executar Pantalla acústica per a espectacles a l'aire lliure

1.403 vots

Pantalla acústica per a espectacles a l'aire lliure

Objectiu: Disposar d'una pantalla acústica per a la realització d'activitats d'arts escèniques, concerts, etc. en espais a l'aire lliure i altres de tancats no preparats acústicament.

Descripció: Es tracta d'una estructura que millora la qualitat sonora i de les actuacions musicals, ja que la microfonia és molt més efectiva. Es tracta d'una infraestructura mòbil, que es pot muntar a qualsevol lloc i està construïda amb elements tèxtils i d'alumini, fusta i plàstic. La pantalla acústica es farà amb aquests materials perquè en faciliten el muntatge i el transport amb un equip humà reduït.

**Ubicació:**

Diferents espais, carrer, parcs, claustre, església

**Àmbit:**

Cultura

**Cost aprox.:**

45.000 €

**Termini aprox.**

execució: 3 mesos

Ajuntament
de SantCugat





Seguiment de l'execució:

Ubicació

Diferents espais.

Descripció

La proposta s'ha treballat explorant totes les opcions de pantalles acústiques mòbils del mercat. Les pantalles han de millorar la sonoritat de les actuacions musicals en acústic.

Seguiment de l'execució:

Desembre 2016. Primeres trobades amb el grup de seguiment i la Taula de música.

Gener 2017. Es plantegen dues opcions tècniques: a) Maletes. Té costos afegits de muntatge especialitzat. b) remolc amb escenari acústic. Més fàcil de muntar.

Febrer 2017. Estudi de les opcions de pantalla juntament amb els proposants.

Abril 2017. L'opció del remolc representa un sobre cost molt alt. Es valora la opció de les maletes.

Maig 2017. Estudi de les opcions de elements i dimensionat.

Juny 2017. Contractació de la compra dels elements.

Gener

02-01-17

09-01-17

16-01-17

23-01-17

30-01-17

06-02-17

13-02-17

20-02-17

27-02-17

Febrer

06-03-17

13-03-17

20-03-17

27-03-17

Març

03-04-17

10-04-17

17-04-17

24-04-17

Abril

01-05-17

08-05-17

15-05-17

22-05-17

29-05-17

Maig

05-06-17

12-06-17

19-06-17

26-06-17

Juny

03-07-17

10-07-17

17-07-17

24-07-17

31-07-17

Juliol

Agost

07-08-17

14-08-17

21-08-17

28-08-17

Setembre

04-09-17

11-09-17

18-09-17

25-09-17

Octubre

02-10-17

09-10-17

16-10-17

23-10-17

30-10-17

Novembre

06-11-17

13-11-17

20-11-17

27-11-17

Desembre

04-12-17

11-12-17

18-12-17

25-12-17

